Investitor: OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ
Objekt: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE BRITOF - PREDOSLJE

TERMINSKI PLAN NAPREDOVANJA DEL

RIKO, d.o.o.
PIRC GRADNJE d.o.o.

ID	Naloga / Faza	Trajanje	Začetek	Konec
68	KANAL MB16	34 d	Pon 21.10.19	Ned 24.11.19
69	KANAL MB18	34 d	Sre 4.12.19	Tor 7.1.20
70	KANAL MO2.3 IN MO2.4	69 d	Sre 13.11.19	Tor 21.1.20
71	KANAL MO2.1	16 d	Pon 9.3.20	Sre 25.3.20
72	KANAL MO3, MO3.4 IN MO3.7	86 d	Sre 8.1.20	Ned 5.4.20
73	KANAL MP1.1 IN MP1.2	69 d	Ned 12.4.20	Sob 20.6.20
74	KANAL MP1.3 IN MP 1.4	77 d	Pon 6.4.20	Pon 22.6.20
75	KANAL MP2 IN MP2.1	88 d	Ned 5.1.20	Čet 2.4.20
76	KANAL MP3	8 d	Pet 3.4.20	Sob 11.4.20
77	KANAL MP5, MP5.2 IN MP5.1	43 d	Sob 27.6.20	Ned 9.8.20
78	KANAL MP10	8 d	Tor 5.5.20	Sre 13.5.20
79	KANAL MP11	8 d	Pon 15.6.20	Tor 23.6.20
80	KANAL MP12	23 d	Ned 12.7.20	Tor 4.8.20
81	KANAL MP13 IN MP13.1	32 d	Sre 24.6.20	Ned 26.7.20
82	KANAL MP15	16 d	Pon 1.6.20	Sre 17.6.20
83	KANAL MP16	10 d	Sre 1.7.20	Sob 11.7.20
84	**VODOVOD B1**	**517 d**	**Sob 23.3.19**	**Pet 21.8.20**
85	VODOVOD B1	170 d	Sob 23.3.19	Pon 9.9.19
86	VODOVOD B1.1	16 d	Sob 23.3.19	Pon 8.4.19
87	VODOVOD B2	88 d	Tor 14.5.19	Sob 10.8.19
88	VODOVOD B3, B3.1 IN B3.2	26 d	Tor 8.10.19	Ned 3.11.19
89	VODOVOD B4	10 d	Sre 18.9.19	Sob 28.9.19
90	VODOVOD B4.1	8 d	Ned 29.9.19	Pon 7.10.19
91	VODOVOD B5	8 d	Pon 5.8.19	Tor 13.8.19
92	VODOVOD B6 IN B61	26 d	Tor 9.7.19	Ned 4.8.19
93	VODOVOD B7, B7.1, B7.2 IN B7.3	43 d	Ned 26.5.19	Pon 8.7.19
94	VODOVOD B8, B8.1 IN B8.2	41 d	Sre 10.4.19	Tor 21.5.19
95	VODOVOD B10 IN B10.1	34 d	Sre 14.8.19	Tor 17.9.19
96	VODOVOD B11	8 d	Pon 4.11.19	Tor 12.11.19
97	VODOVOD B12	43 d	Sob 17.8.19	Ned 29.9.19
98	VODOVOD B13	43 d	Sob 7.9.19	Ned 20.10.19
99	VODOVOD B14	8 d	Pon 25.11.19	Tor 3.12.19
100	VODOVOD B15 IN B15.1	32 d	Sob 3.8.19	Sre 4.9.19
101	VODOVOD B16	34 d	Pon 21.10.19	Ned 24.11.19
102	VODOVOD B18, B18.1 IN B18.2	34 d	Sre 4.12.19	Tor 7.1.20
103	VODOVOD B2.1	69 d	Sre 13.11.19	Tor 21.1.20
104	VODOVOD O2.1	69 d	Sre 15.1.20	Tor 24.3.20
105	VODOVOD O2.2	18 d	Sre 19.2.20	Ned 8.3.20
106	VODOVOD O2.2.1	8 d	Pon 10.2.20	Tor 18.2.20
107	VODOVOD O2.4 IN O2.4.1.	18 d	Sre 22.1.20	Ned 9.2.20
108	VODOVOD O3,O3.4,O3.5,O3.6,O3.7,O3.7.1 IN O3.8	88 d	Sre 8.1.20	Ned 5.4.20
109	VODOVOD P5.3	8 d	Sob 28.3.20	Ned 5.4.20
110	VODOVOD P1.1 IN P1.1.1	69 d	Ned 12.4.20	Sob 20.6.20
111	VODOVOD P1	69 d	Pon 6.4.20	Ned 14.6.20
112	VODOVOD P2, P2.1, P2.1.1, P2.2, P2.3, P2.4 IN P2.5	88 d	Ned 5.1.20	Čet 2.4.20
113	VODOVOD P3	8 d	Pet 3.4.20	Sob 11.4.20
114	VODOVOD P4.1	5 d	Ned 21.6.20	Pet 26.6.20
115	VODOVOD P5 IN P5.1	34 d	Sob 27.6.20	Pet 31.7.20
116	VODOVOD P5.2	15 d	Pon 6.4.20	Tor 21.4.20
117	VODOVOD P5.4	12 d	Sre 22.4.20	Pon 4.5.20
118	VODOVOD P7	10 d	Sre 5.8.20	Sob 15.8.20
119	VODOVOD P8	8 d	Pon 27.7.20	Tor 4.8.20
120	VODOVOD P9.1	16 d	Sre 5.8.20	Pet 21.8.20
121	VODOVOD P10	8 d	Tor 5.5.20	Sre 13.5.20
122	VODOVOD P11	8 d	Pon 15.6.20	Tor 23.6.20
123	VODOVOD P12	23 d	Ned 12.7.20	Tor 4.8.20
124	VODOVOD P13, P13.1 IN P13.2	32 d	Sre 24.6.20	Ned 26.7.20
125	VODOVOD P15 IN P15.1	16 d	Pon 1.6.20	Sre 17.6.20
126	VODOVOD P16 IN P 16.1	24 d	Sob 20.6.20	Tor 14.7.20
127	**ZAKLJUČNA DELA**	**522 d**	**Sob 23.3.19**	**Sre 26.8.20**
128	Izdelava finega planuma in asfaltiranje	447 d	Tor 21.5.19	Pon 10.8.20
129	Ureditev bankin	446 d	Pet 31.5.19	Sre 19.8.20
130	Humuziranje in ureditev brežin	476 d	Čet 2.5.19	Čet 20.8.20
131	Geodetski posnetek	520 d	Sob 23.3.19	Pon 24.8.20
132	Priprava dokumentacije za tehnični pregled in tehnični pregled	180 d	Pet 28.2.20	Sre 26.8.20
133	**IZDAJA POTRDILA O PREVZEMU**	28 d	Sre 26.8.20	Sre 23.9.20
134	ROK ZA REKLAMACIJO NAPAK	180 d	Sre 23.9.20	Pon 22.3.21
135	**IZDAJA POTRDILA O IZVEDBI**	29 d	Pon 22.3.21	Pon 19.4.21

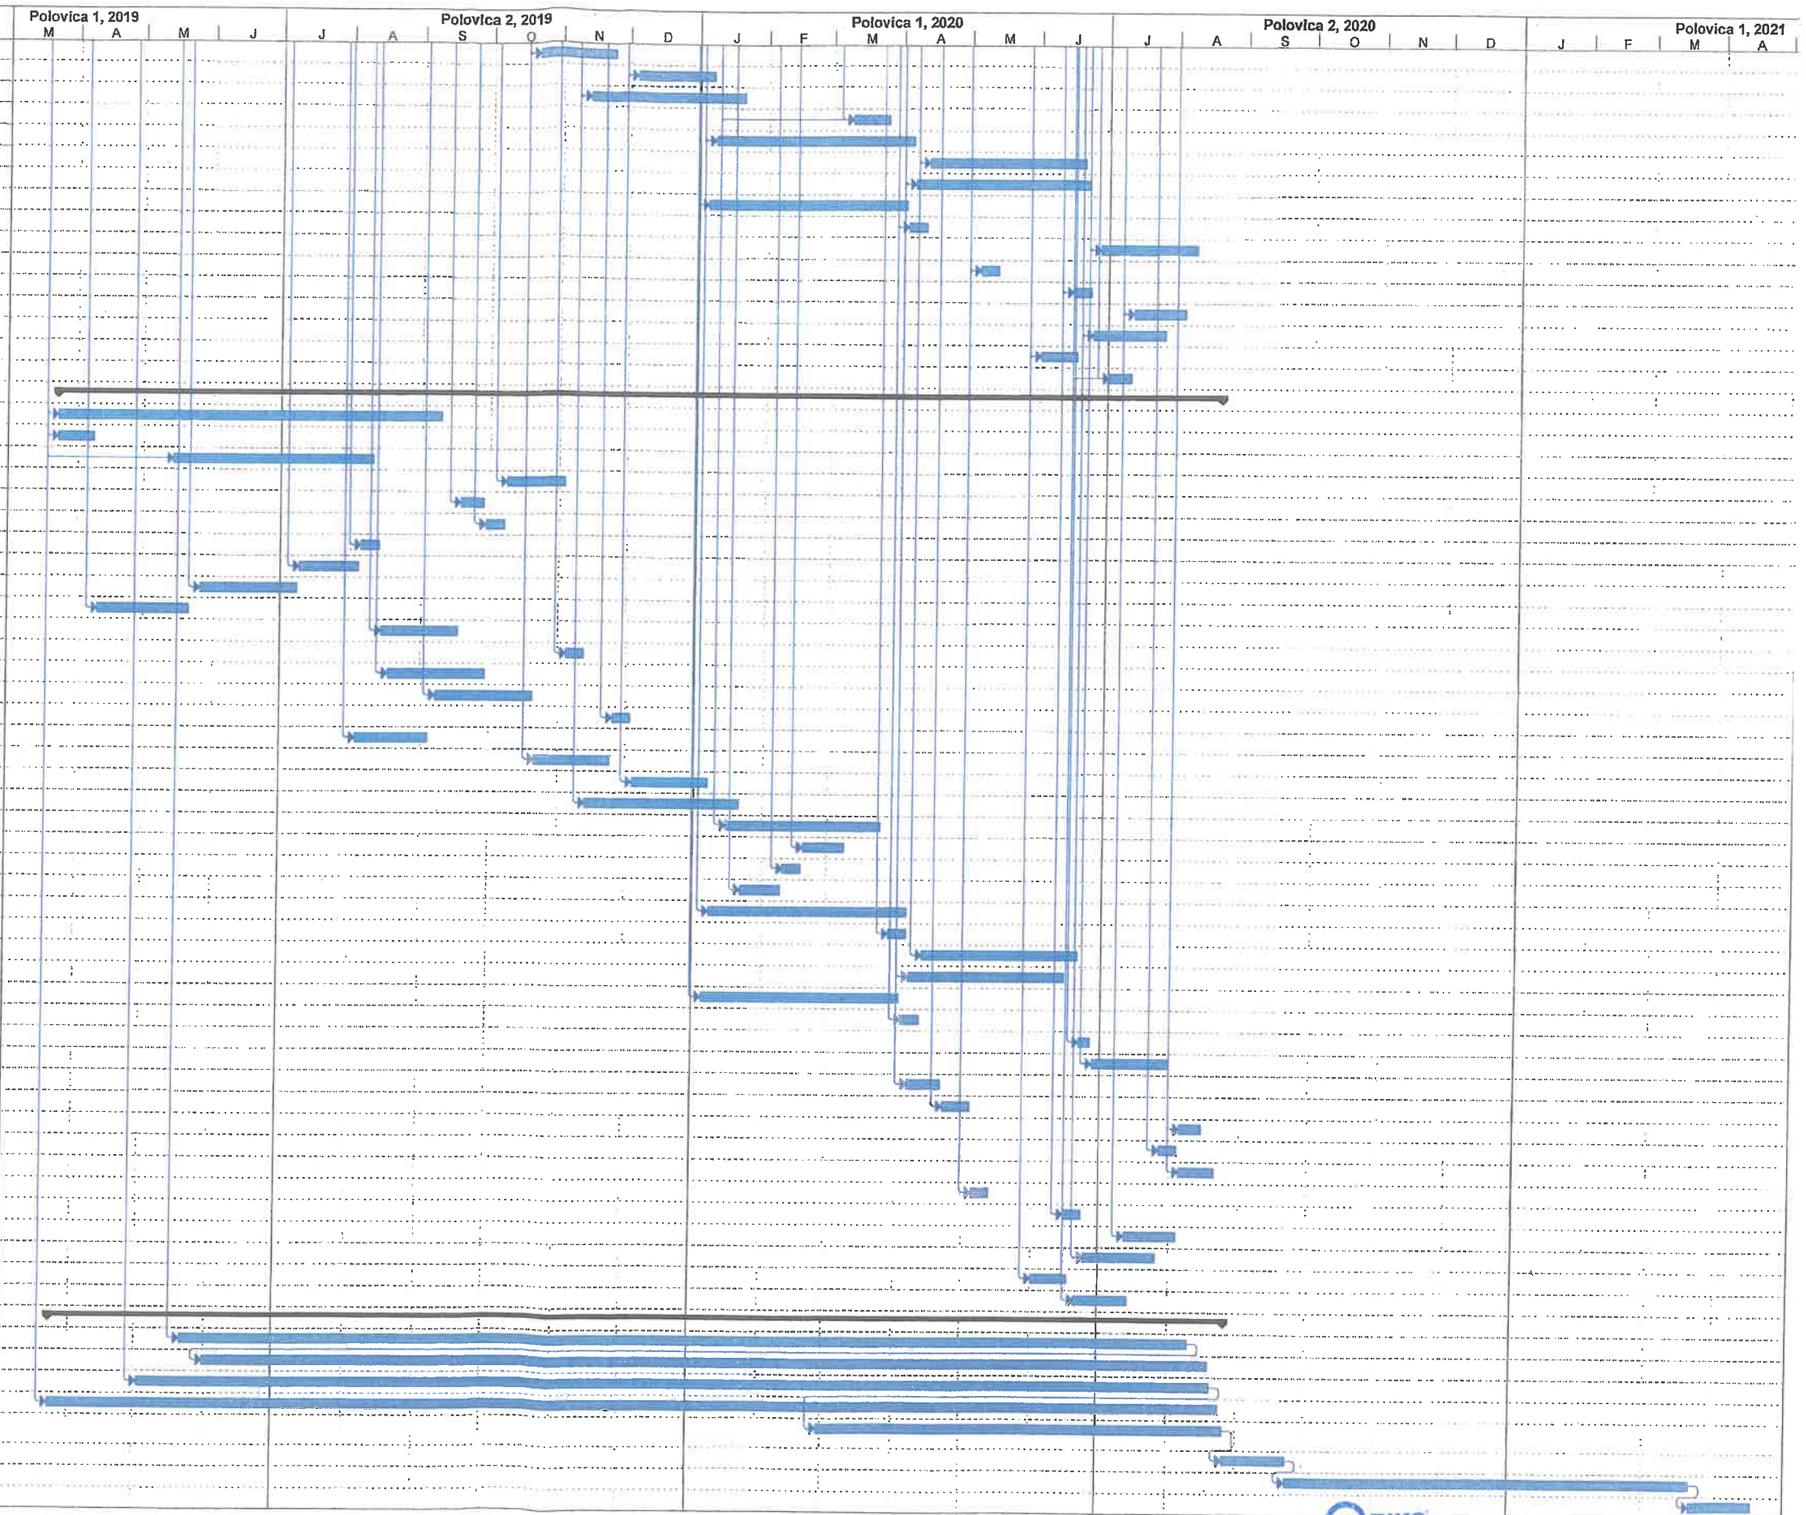

Ljubljana, 12.03.2019

VODJA NADZORA
BOJANA SOVIČ

RIKO
RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.
Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Slovenija

18

Vodja gradenje: Mihaela Agrež
Vodja del: Franc PIRC

Investitor: OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ
Objekt: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE BRITOF - PREDOSLJE

TERMINSKI PLAN NAPREDOVANJA DEL

RIKO, d.o.o.
PIRC GRADNJE d.o.o.

ID	Naloga / Faza	Trajanje	Začetek	Konec
1	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	540 d	Sre 6.3.19	Čet 27.8.20
2	PRIPRAVLJALNA, ZEMELJSKA, GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA	540 d	Sre 6.3.19	Čet 27.8.20
3	UVEDBA V DELO	540 d	Sre 6.3.19	Čet 27.8.20
4	Pripravljalna dela (zavarovanje in ureditev gradbišča)	540 d	Sre 6.3.19	Čet 27.8.20
5	Postavitev cestne zapore in zakoličba obstoječih komunalnih vodov	523 d	Sob 23.3.19	Čet 27.8.20
6	FEKALNA KANALIZACIJA B1	516 d	Sob 23.3.19	Čet 20.8.20
7	KANAL B1	146 d	Sob 23.3.19	Pet 16.8.19
8	KANAL B1.1	8 d	Sob 23.3.19	Ned 31.3.19
9	KANAL B2	78 d	Tor 14.5.19	Sre 31.7.19
10	KANAL B3, B3.1 IN B3.2	26 d	Tor 8.10.19	Ned 3.11.19
11	KANAL B4	10 d	Sre 18.9.19	Sob 28.9.19
12	KANAL B4.1	8 d	Ned 29.9.19	Pon 7.10.19
13	KANAL B5	8 d	Pon 5.8.19	Tor 13.8.19
14	KANAL B6	26 d	Tor 9.7.19	Ned 4.8.19
15	KANAL B7, B7.1, B7.2 IN B7.3	43 d	Ned 26.5.19	Pon 8.7.19
16	KANAL B8, B8.1 IN B8.2	45 d	Sre 10.4.19	Sob 25.5.19
17	KANAL B9	8 d	Pon 1.4.19	Tor 9.4.19
18	KANAL B10 IN B10.1	34 d	Sre 14.8.19	Tor 17.9.19
19	KANAL B11	8 d	Pon 4.11.19	Tor 12.11.19
20	KANAL B12, B12.1 IN B12.1.1	43 d	Sob 17.8.19	Ned 29.9.19
21	KANAL B13	43 d	Sob 7.9.19	Ned 20.10.19
22	KANAL B14	8 d	Pon 25.11.19	Tor 3.12.19
23	KANAL B15 IN B15.1	32 d	Sob 3.8.19	Sre 4.9.19
24	KANAL B16 IN B16.1 IN Č1	34 d	Pon 21.10.19	Ned 24.11.19
25	KANAL B18, B18.1, B18.2, B18.3 IN Č5	34 d	Sre 4.12.19	Tor 7.1.20
26	KANAL O1, O1.1 IN O1.2	69 d	Sre 13.11.19	Tor 21.1.20
27	KANAL O2	96 d	Pon 30.9.19	Sob 4.1.20
28	KANAL O2.1	16 d	Pon 9.3.20	Sre 25.3.20
29	KANAL O2.2	18 d	Sre 19.2.20	Ned 8.3.20
30	KANAL O2.3	8 d	Pon 10.2.20	Tor 18.2.20
31	KANAL O2.4	16 d	Sre 22.1.20	Ned 9.2.20
32	KANAL O3, O3.4, O3.5, O3.6, O3.7, O3.8, O3.9, Č2 IN Č3	88 d	Sre 8.1.20	Ned 5.4.20
33	KANAL O3.1	8 d	Sob 28.3.20	Ned 5.4.20
34	KANAL P1.1 IN P1.1.1	69 d	Ned 12.4.20	Sob 20.6.20
35	KANAL P1.2 IN Č4	69 d	Pon 6.4.20	Ned 14.6.20
36	KANAL P2, P2.1, P2.2, P2.3, P2.4 IN P2.5	88 d	Ned 5.1.20	Čet 2.4.20
37	KANAL P3	8 d	Pet 3.4.20	Sob 11.4.20
38	KANAL P4.1	5 d	Ned 21.6.20	Pet 26.6.20
39	KANAL P5 IN P5.1	31 d	Sob 27.6.20	Tor 28.7.20
40	KANAL P5.2 IN P5.3	15 d	Pon 6.4.20	Tor 21.4.20
41	KANAL P5.4	12 d	Sre 22.4.20	Pon 4.5.20
42	KANAL P7	10 d	Sre 5.8.20	Sob 15.8.20
43	KANAL P8	8 d	Pon 27.7.20	Tor 4.8.20
44	KANAL P9 IN 9.1	15 d	Sre 5.8.20	Čet 20.8.20
45	KANAL P10	8 d	Tor 5.5.20	Sre 13.5.20
46	KANAL P10.1	15 d	Sob 16.5.20	Ned 31.5.20
47	KANAL P11	8 d	Pon 15.6.20	Tor 23.6.20
48	KANAL P12	23 d	Ned 12.7.20	Tor 4.8.20
49	KANAL P13, P13.1, P13.2 IN P13.3	32 d	Sre 24.6.20	Ned 26.7.20
50	KANAL P14	10 d	Sob 20.6.20	Tor 30.6.20
51	KANAL P15 IN P15.1	16 d	Pon 1.6.20	Sre 17.6.20
52	KANAL P16	10 d	Sre 1.7.20	Sob 11.7.20
53	METEORNA KANALIZACIJA MB1 IN MB3	505 d	Sob 23.3.19	Ned 9.8.20
54	KANAL MB1 IN MB3	172 d	Sob 23.3.19	Sre 11.9.19
55	KANAL MB2.1 IN MB2.2	88 d	Tor 14.5.19	Sob 10.8.19
56	KANAL MB3	26 d	Tor 8.10.19	Ned 3.11.19
57	KANAL MB4	10 d	Sre 18.9.19	Sob 28.9.19
58	KANAL MB4.1	8 d	Ned 29.9.19	Pon 7.10.19
59	KANAL MB5	8 d	Pon 5.8.19	Tor 13.8.19
60	KANAL MB6, MB6.1	26 d	Tor 9.7.19	Ned 4.8.19
61	KANAL MB7, MB7.1, MB7.2 IN MB7.3	43 d	Ned 26.5.19	Pon 8.7.19
62	KANAL MB8, MB8.1 IN MB8.2	45 d	Sre 10.4.19	Sob 25.5.19
63	KANAL MB10	34 d	Sre 14.8.19	Tor 17.9.19
64	KANAL MB12	43 d	Sob 17.8.19	Ned 29.9.19
65	KANAL MB13	43 d	Sob 7.9.19	Ned 20.10.19
66	KANAL MB14	8 d	Pon 25.11.19	Tor 3.12.19
67	KANAL MB15 IN MB15.1	32 d	Sob 3.8.19	Sre 4.9.19

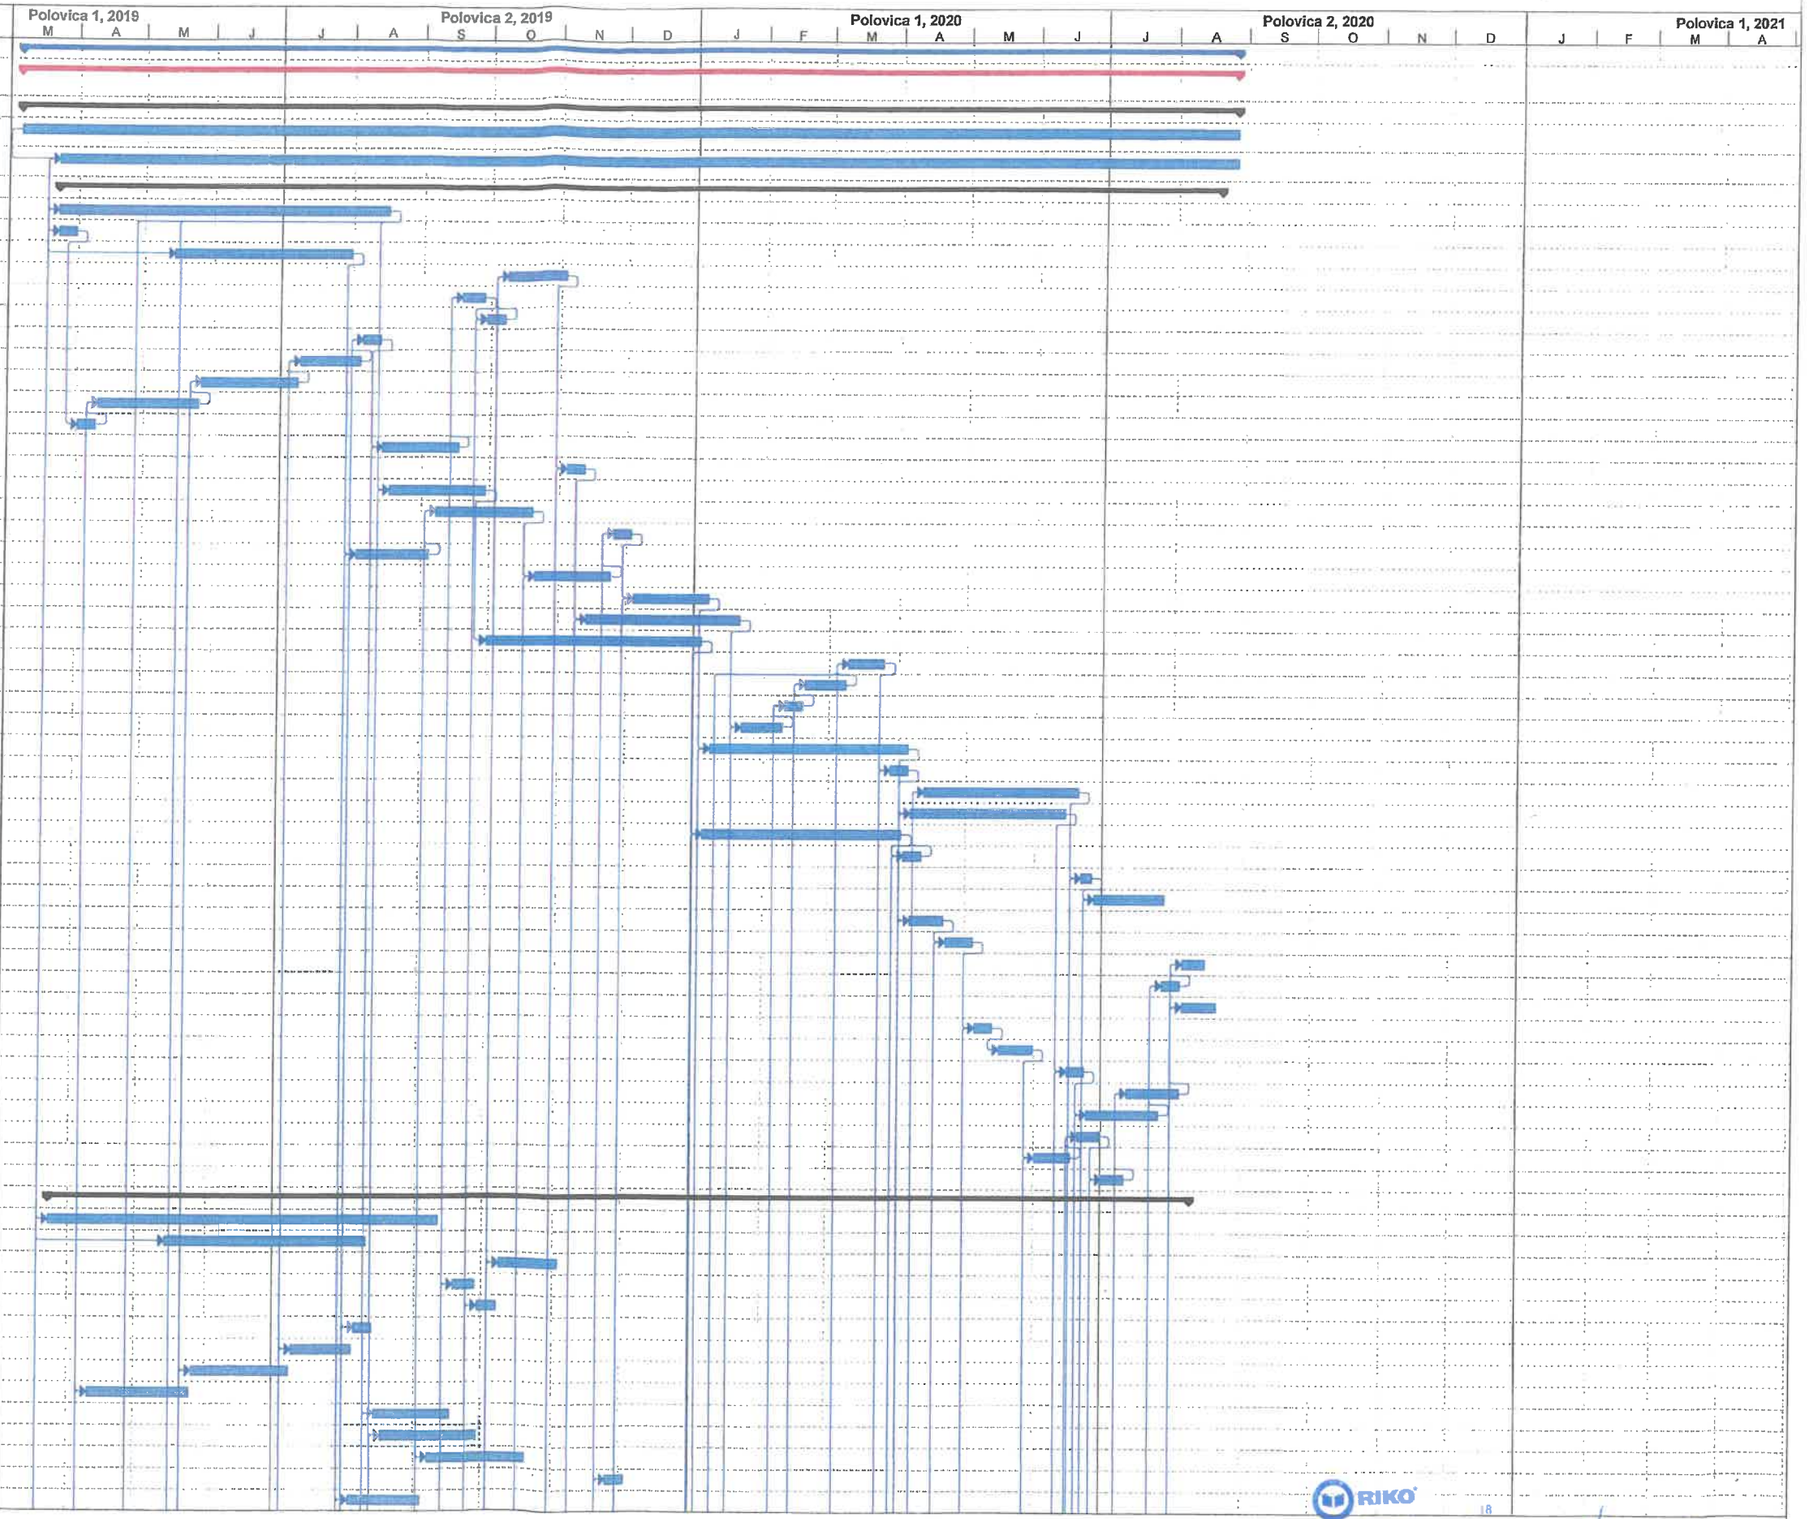

Ljubljana, 12.03.2019

VODJA NADZORA
BOJANA SOVO

RIKO
RIKO, industrijski, gradbeni inženiring
in leasing d.o.o.
Blejanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Slovenija

Vodja gradenje: Mihaela Agrež
Vodja del: Franc PIRC
